

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia di Nuoro



PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI E LE INFRASTRUTTURE DELLA LOTTIZZAZIONE DI BACCU ARTHACCI A VILLANOVA STRISAILI

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Comune di Villagrande Strisaili
Via Roma, 1
Tel. 0782/32014 - Fax 0782/32751
P.IVA 0190790915 - C.F. 82000010916
E-mail: info@comune.villagrandestrisaili.og.it
Pec: potocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it

Il Sindaco

Dott. Alessio Seoni

Il R.U.P.

Ing. Stefania Deplano

Progettazione:

Ufficio tecnico

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

All.04c

DATA

Novembre 2020

REVISIONE

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

ID	Nome	Durata 165,00 g - (240 g)	Inizio	Fine	08 feb 21					15 feb 21					22 feb 21					01 mar 21					08 mar 21					15 mar 21													
					d	l	m	m	g	v	s	d	d	l	m	m	g	v	s	d	d	l	m	m	g	v	s	d	d	l	m	m	g	v	s	d	d	l	m	m	g	v	s
1	01 - LAVORI STRADALI	60,00	lun 08/02/21	lun 20/09/21	[Shaded area]																																						
2	02 - RETE IDRICA	30,00	lun 22/03/21	lun 03/05/21	[Shaded area]																																						
3	03 - RETE FOGNARIA	33,00	mar 04/05/21	ven 18/06/21	[Shaded area]																																						
4	04 - RETE ACQUE METEORICHE	33,00	mer 09/06/21	ven 23/07/21	[Shaded area]																																						
5	05 - RETE ILLUMINAZIONE	40,00	mer 23/06/21	mar 24/08/21	[Shaded area]																																						
6	06 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	50,00	lun 12/07/21	ven 24/09/21	[Shaded area]																																						
7	07 - OPERE A VERDE	10,00	mer 22/09/21	mar 05/10/21	[Shaded area]																																						

24 mag 21							31 mag 21							07 giu 21							14 giu 21							21 giu 21							28 giu 21							05 lug 21							12 lug 21							19 lug 21							26 lug 21																											
l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d														
																					[Red horizontal bar]							[Red horizontal bar]							[Red horizontal bar]							[Red horizontal bar]							[Red horizontal bar]																																									

04 ott 21					11 ott 21					18 ott 21					25 ott 21					01 nov 21					08 nov 21					15 nov 21					22 nov 21					29 nov 21					06 dic 21																																												
m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d																					

PROGRAMMA DEI LAVORI

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 08/02/2021 a 26/02/2021	da 27/02/2021 a 19/03/2021	da 20/03/2021 a 18/06/2021	da 19/06/2021 a 16/07/2021	da 17/07/2021 a 09/08/2021	da 10/08/2021 a 30/08/2021
01 - LAVORI STRADALI	€ 458.180,03	€ 114.545,01	€ 114.545,01			€ 38.181,67	€ 76.363,34
02 - RETE IDRICA	€ 46.426,97			€ 46.426,97			
03 - RETE FOGNARIA	€ 31.484,66			€ 31.484,66			
04 - RETE ACQUE METEORICHE	€ 155.185,05			€ 37.620,62	€ 94.051,55	€ 23.512,88	
05 - RETE ILLUMINAZIONE	€ 47.635,55				€ 21.436,00	€ 19.054,22	€ 7.145,33
06 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	€ 156.665,61				€ 15.666,56	€ 50.133,00	€ 31.333,12
07 - OPERE A VERDE	€ 4.422,13						
IMPORTO		€ 114.545,01	€ 114.545,01	€ 115.532,25	€ 131.154,11	€ 130.881,77	€ 114.841,79
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 114.545,01	€ 229.090,02	€ 344.622,27	€ 475.776,38	€ 606.658,15	€ 721.499,94
%		12,73%	12,73%	12,84%	14,57%	14,54%	12,76%
% PROGRESSIVA		12,73%	25,45%	38,29%	52,86%	67,41%	80,17%

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 31/08/2021 a 14/09/2021	da 15/09/2021 a 05/10/2021				
01 - LAVORI STRADALI	€ 458.180,03	€ 83.999,67	€ 30.545,33				
02 - RETE IDRICA	€ 46.426,97						
03 - RETE FOGNARIA	€ 31.484,66						
04 - RETE ACQUE METEORICHE	€ 155.185,05						
05 - RETE ILLUMINAZIONE	€ 47.635,55						
06 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	€ 156.665,61	€ 34.466,43	€ 25.066,50				
07 - OPERE A VERDE	€ 4.422,13		€ 4.422,13				
IMPORTO		€ 118.466,10	€ 60.033,96				
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 839.966,04	€ 900.000,00				
%		13,16%	6,67%				
% PROGRESSIVA		93,33%	100,00%				


PROGRAMMAZIONE S.A.L.

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
08/02/2021	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
26/02/2021	19	19	€ 122.379,09	€ 122.379,09	13,60%	Si
19/03/2021	40	21	€ 244.758,18	€ 122.379,09	27,20%	Si
18/06/2021	131	91	€ 360.290,43	€ 115.532,25	40,03%	Si
16/07/2021	159	28	€ 488.187,82	€ 127.897,39	54,24%	Si
09/08/2021	183	24	€ 611.259,47	€ 123.071,65	67,92%	Si
30/08/2021	204	21	€ 724.810,58	€ 113.551,11	80,53%	Si
14/09/2021	219	15	€ 841.856,91	€ 117.046,33	93,54%	Si
05/10/2021	240	21	€ 900.000,00	€ 58.143,09	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

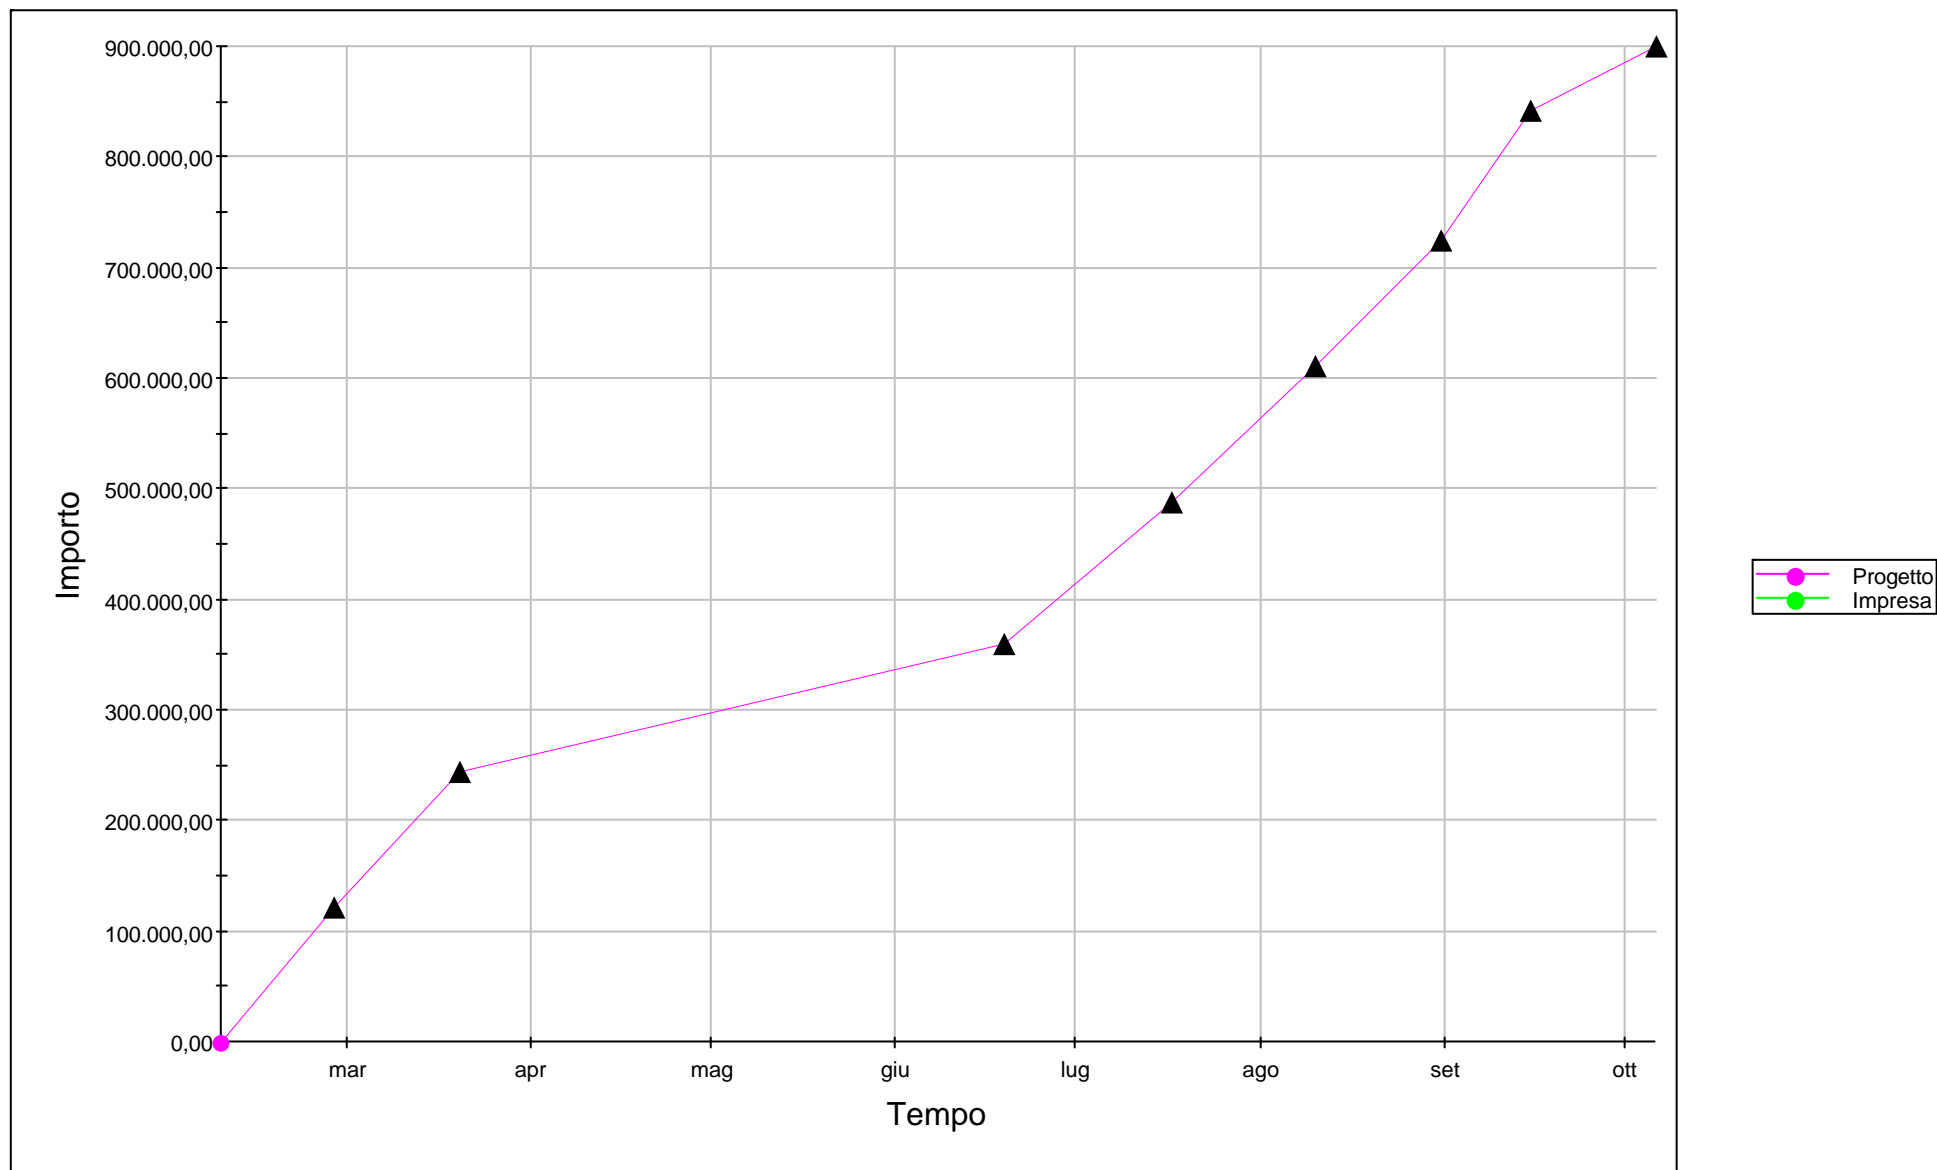

LEGENDA: ■ punto che delimita periodi a media di produzione costante
 ■ Stato Avanzamento Lavori programmato
